



TAVOLO DELLA TRASPARENZA


Regione PIEMONTE

Torino, 17 luglio 2008

Il piano industriale Sogin**Attività in Piemonte**

	Linee guida	Attività realizzate 2007/2008
Accelerazione del decommissioning	<ul style="list-style-type: none"> Riduzione dei tempi di smantellamento e recupero di efficienza 	<ul style="list-style-type: none"> Attività I semestre 2008 superiori del 160% rispetto al 2007 e alla media 2000-2007; riduzione costi di funzionamento di 4 M€ nel 2007 e 6.5 M€ nel 2008
Patto con le istituzioni	<ul style="list-style-type: none"> Concertazione con le autorità di controllo e confronto costante con enti e istituzioni locali 	<ul style="list-style-type: none"> Nuovo sistema di remunerazione Miglioramento rapporto con istituzioni locali
Eccellenza nella sicurezza	<ul style="list-style-type: none"> Investimenti in adeguamenti degli impianti, nella formazione e nella comunicazione 	<ul style="list-style-type: none"> Sviluppo “Progetto Sicurezza” (investimento di 80 M€ in 30 mesi) Investimenti in formazione e avvio Scuola di Radioprotezione
Valorizzazione asset e competenze	<ul style="list-style-type: none"> Valorizzazione dei siti e sviluppo del know-how nucleare 	<ul style="list-style-type: none"> Predisposti business plan per valorizzazione asset
Organizzazione	<ul style="list-style-type: none"> Nuovo modello organizzativo “orientato al risultato” 	<ul style="list-style-type: none"> Implementato nuovo modello organizzativo Avviate attività di re-ingegnerizzazione dei processi chiave


Sogin impegnata nella gestione di un forte processo di cambiamento

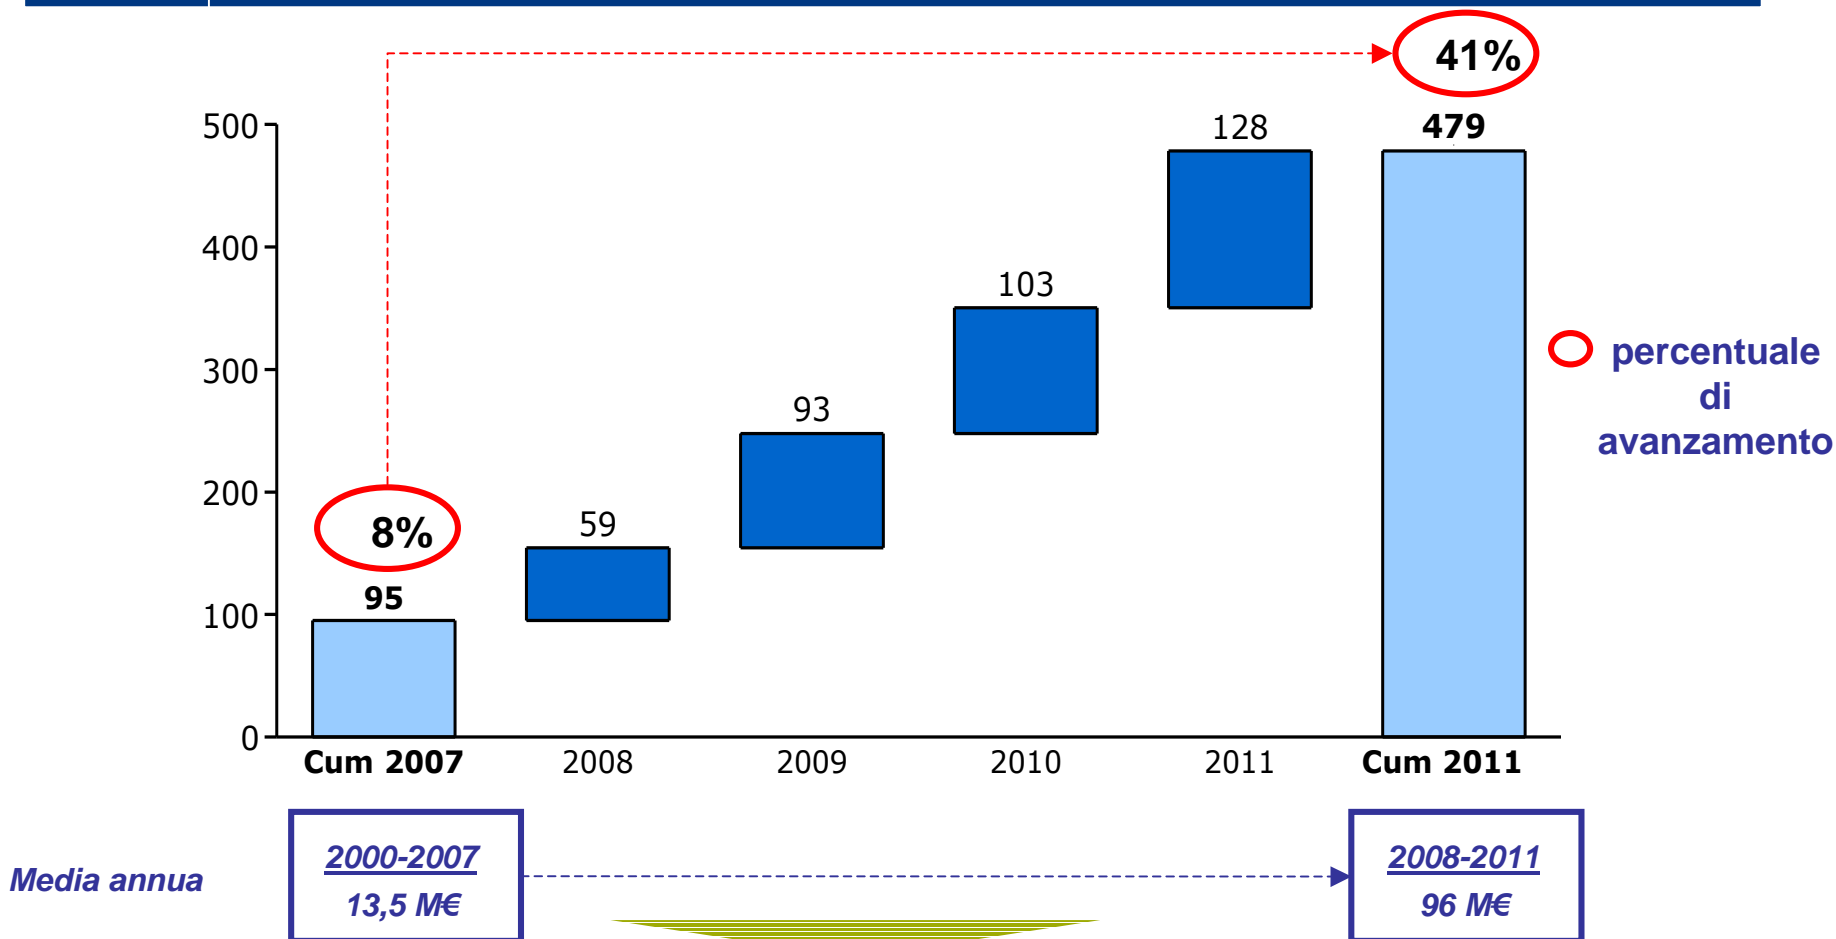

Obiettivo del 41 per cento di avanzamento medio del decommissioning nel 2011

L'accelerazione produrrà un significativo risparmio per il consumatore elettrico

Accelerazione del decommissioning

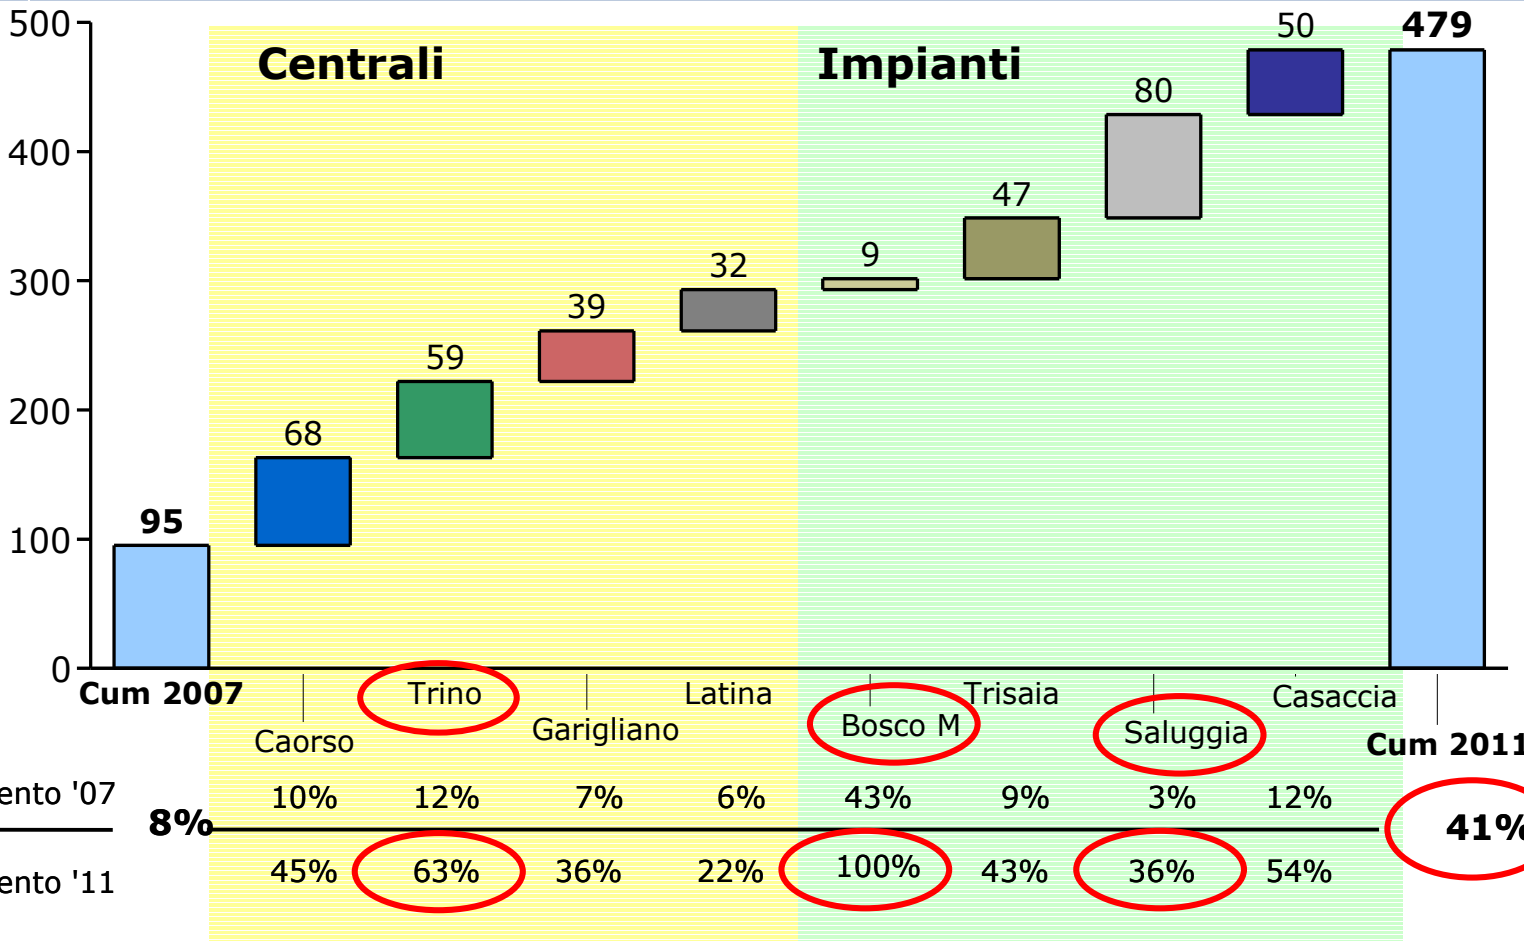

Forte accelerazione per Bosco Marengo, Trino e Saluggia

Nota: include soli costi esterni di decommissioning

Procedure VIA ed istanze di disattivazione

	Procedure VIA	Istanze di disattivazione	
		Invio richiesta	Data prevista
Saluggia	<ul style="list-style-type: none"> Invio Studio di Impatto Ambientale: ottobre 2005 Parere favorevole per impianto CEMEX il 18 marzo 2008 ✓ 		2011
Caorso	<ul style="list-style-type: none"> Invio Studio di Impatto Ambientale: dicembre 2003 Parere favorevole espresso il 15 maggio 2008 	✓ 2001	2009
Trino	<ul style="list-style-type: none"> Invio Studio di Impatto Ambientale: settembre 2003 Parere favorevole espresso il 19 Giugno 2008 	✓ 2001	2008
Latina	<ul style="list-style-type: none"> Invio Studio di Impatto Ambientale: novembre 2003 Istruttoria in corso. Conclusione prevista entro l'anno 	2001	2009
Garigliano	<ul style="list-style-type: none"> Invio Studio di Impatto Ambientale: giugno 2003 Istruttoria in corso. Conclusione prevista entro l'anno 	2001	2008
Bosco Marengo	<ul style="list-style-type: none"> N.A. 		Agosto 2008
Casaccia	<ul style="list-style-type: none"> N.A. 		2011
Trisaia	<ul style="list-style-type: none"> N.A. 		2011

Sensibile miglioramento del rapporto con le istituzioni per l'accelerazione degli iter autorizzativi

Il piano industriale Sogin


Attività in Piemonte



- L'allontanamento del combustibile dal Piemonte inizierà nel 2010 e si concluderà nel 2011

Trasporti	Data inizio	Data fine
combustibile Eurex da deposito Avogadro	marzo 2010	maggio 2010
combustibile Trino da deposito Avogadro	maggio 2010	luglio 2011
combustibile Garigliano da deposito Avogadro	luglio 2011	dicembre 2011
combustibile da centrale di Trino	dicembre 2010	febbraio 2011

Attività di smantellamento

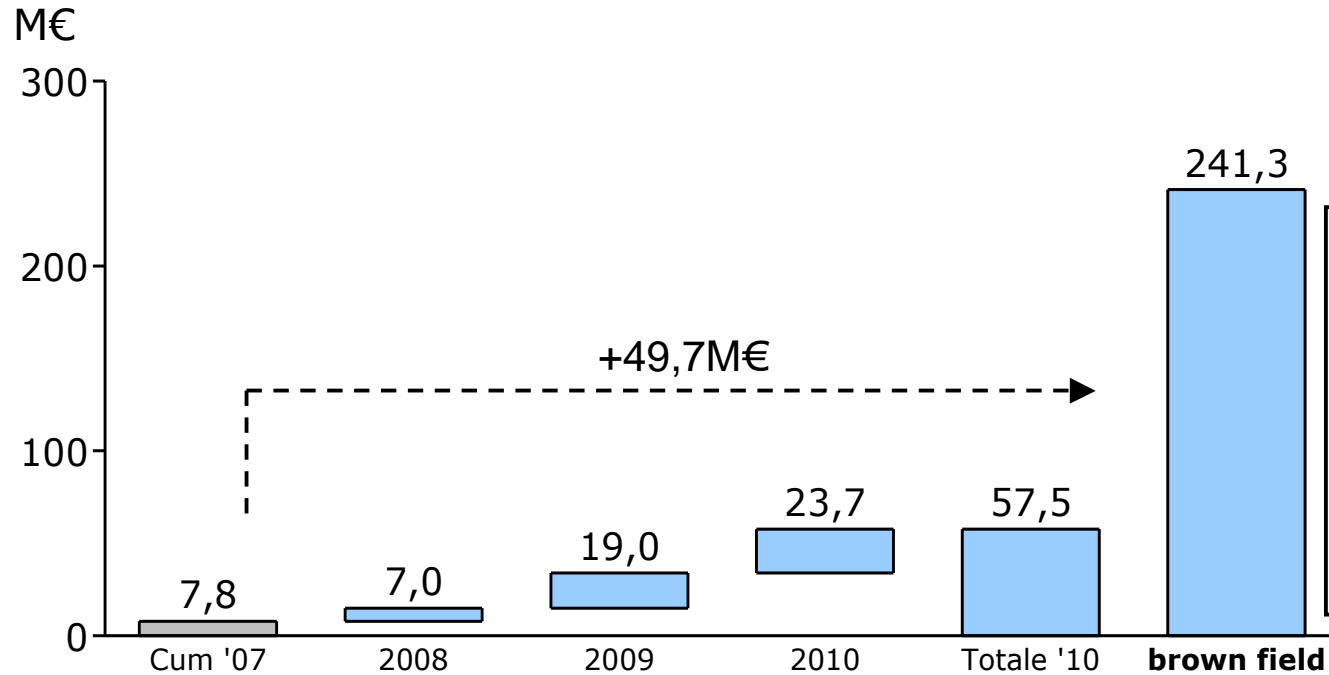**Principali attività 2008-2010**

- Progetto Cemex (12,4M€)
- Condizionamento rifiuti IFEC (7,7M€)
- Svuotamento e pulizia piscina (5,9M€)
- Approvvigionamento Idrico (5,5M€)
- Deposito temporaneo D2 (5,5M€)
- Nuova cabina elettrica (3,4M€)

% brown field
3%

24%

Nel triennio 2008-2010, attività pari a oltre 6 volte quelle realizzate nel 2000-2007

Attività di svuotamento e bonifica della piscina



- Svuotamento e bonifica della piscina: 11 giugno 2008 ✓
- Rilascio controllato dell'acqua: 4 luglio 2008 ✓



Nuovo Parco Serbatoi




- Autorizzazione APAT per l'avvio del trasferimento dei rifiuti: 14 luglio 2008 ✓
 - Conclusione entro ottobre 2008
-

Deposito temporaneo per rifiuti di bassa attività (D-2)



- Autorizzazione Ministero sviluppo economico alla modifica d'impianto: 25 giugno ✓
- Autorizzazione APAT: prevista entro ottobre
- Apertura cantiere: marzo 2009

Impianto Cemex e deposito temporaneo manufatti a media attività

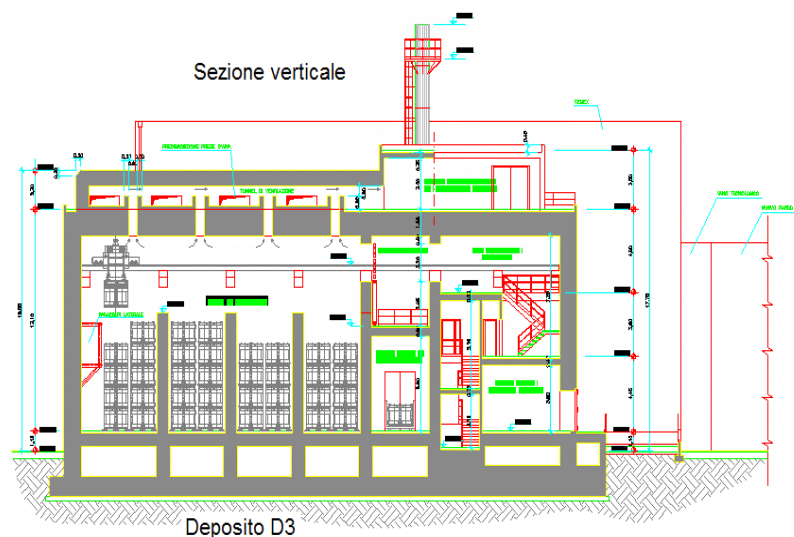
**Obiettivi**

- Preselezione ditte ed avvio della gara per progettazione e realizzazione entro fine 2008

Criticità


- Decreto di compatibilità ambientale: previsto entro settembre
- Approvazione del progetto (APAT e Ministero sviluppo economico)
- Modifica dello strumento urbanistico e opere connesse (Comune di Saluggia)

Modifica del sistema di approvvigionamento idrico

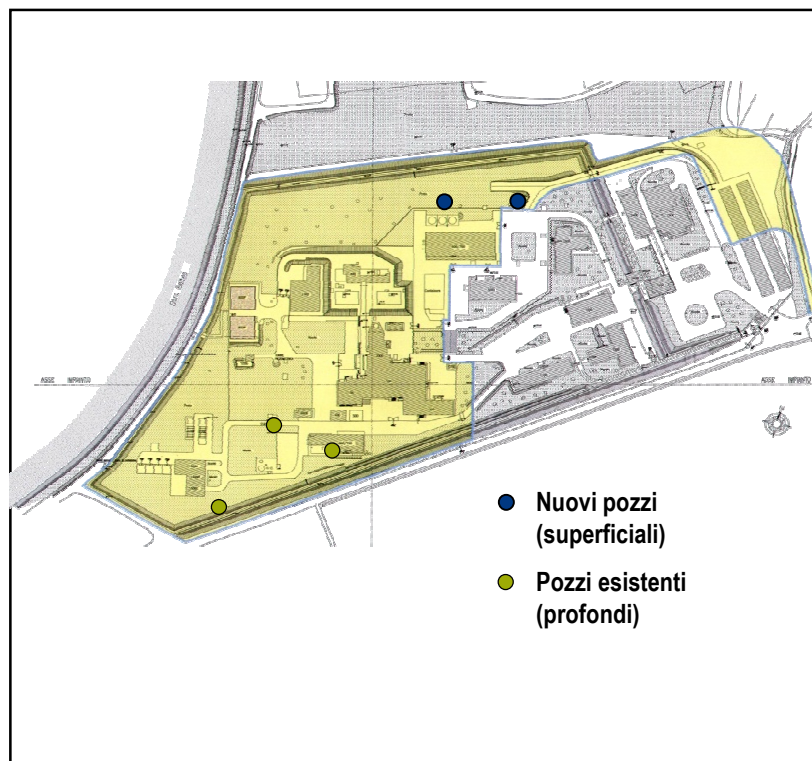

- Rapporto di progetto particolareggiato: approvato a gennaio 2008 ✓
- Apertura cantiere per la realizzazione delle opere civili ✓
- Conclusione prove di portata: fine 2008
- Messa in servizio nuovi pozzi: inizio 2009
- Completamento adeguamenti e sistemazioni finali: entro fine 2010


Rete di monitoraggio della falda acquifera

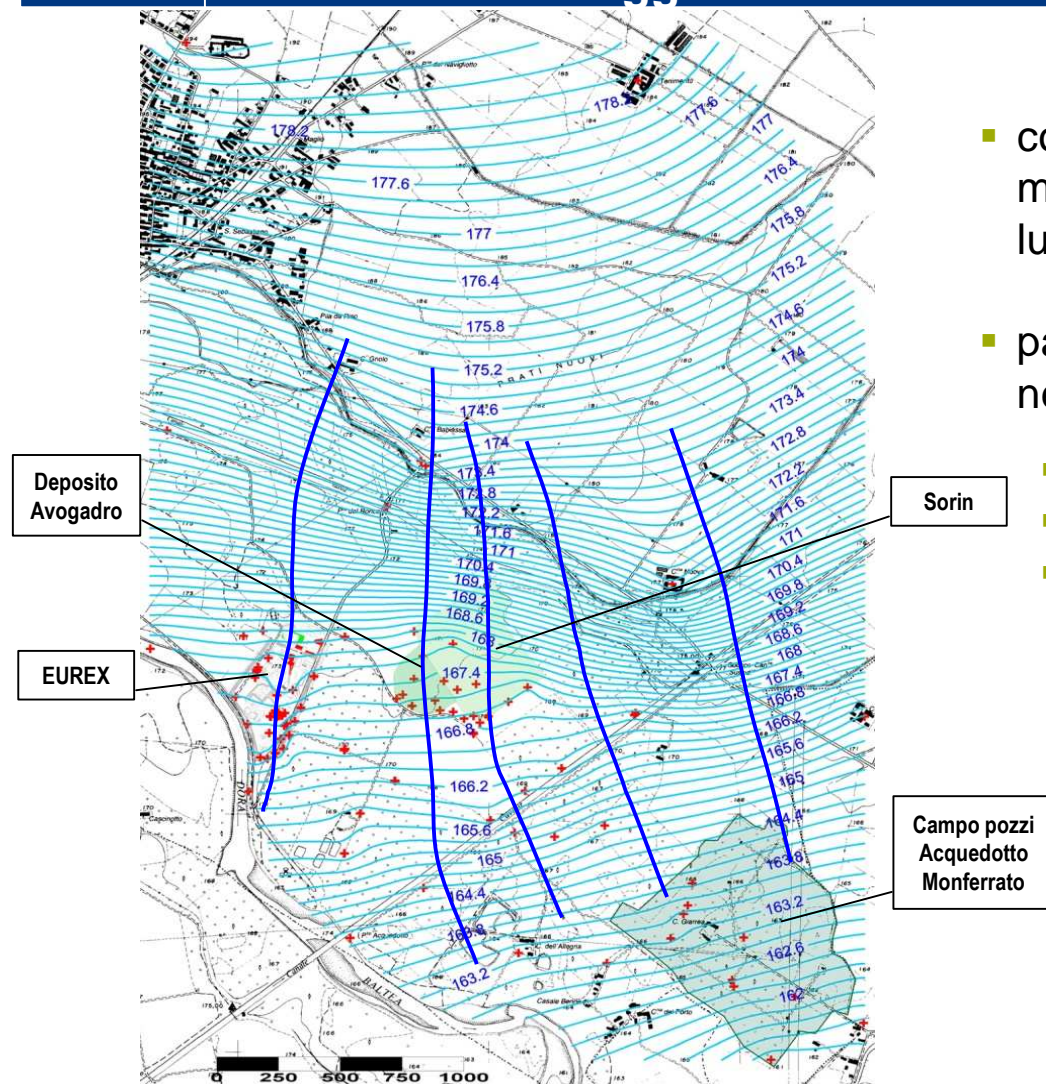

- continua il monitoraggio sui 41 punti di misura e campionamento all'interno e lungo il perimetro dell'impianto EUREX
- partecipazione attiva alle attività condotte nell'ambito del tavolo tecnico, per:
 - rilievo topografico dei punti
 - collaborazione ai campionamenti
 - misure ed elaborazioni freaticometriche

Carta piezometrica della falda superficiale - Misure in m s.l.m. di maggio 2008. In rosso i punti di misura

Attività di smantellamento

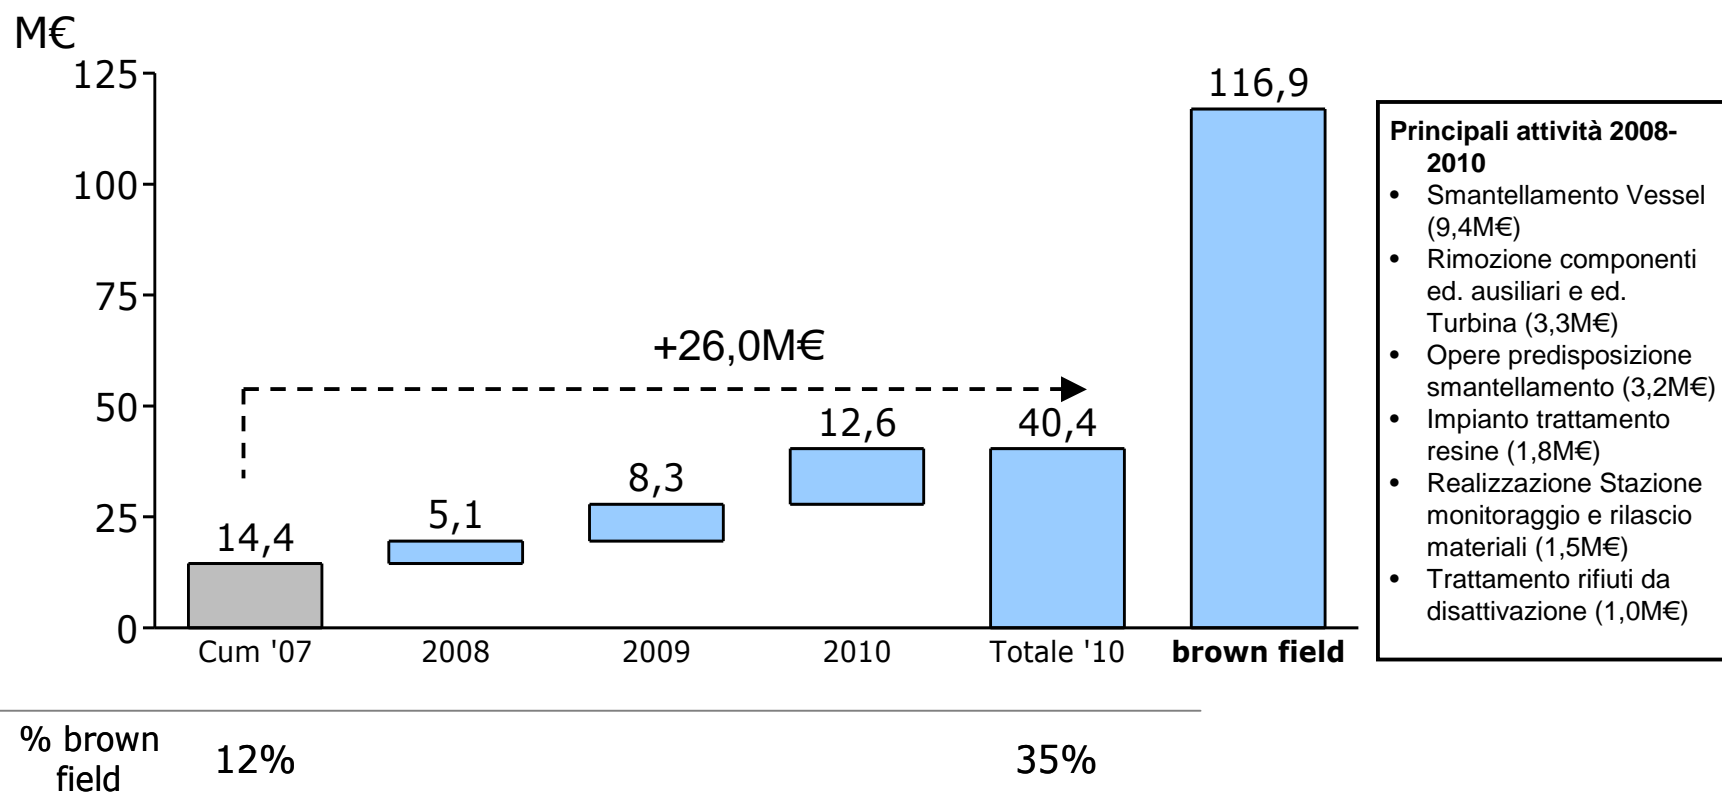

Nel triennio 2008-2010, attività pari a quasi 2 volte quelle realizzate nel 2000-2007



- Formazione di radioprotezione per tutto il personale ✓
- Iter autorizzavo per le modifiche della ventilazione della sezione nucleare ✓
- Gara per l'esecuzione delle modifiche alla ventilazione ✓
- Gara per gli adeguamenti elettrici ✓
- Adeguamento sistema di accesso alla zona controllata dell'Impianto ✓
- Revisione regolamento di esercizio e rapporto finale di sicurezza ✓

Obiettivi 2° semestre 2008




- Esecuzione delle modifica del sistema di ventilazione edificio reattore
- Esecuzione degli adeguamenti dell'impianto elettriche edificio turbina
- Inizio rimozione dei materiali non contaminati dalla zona controllata
- Realizzazione stazione rilascio materiali

Tutte le attività in linea con il programma

Criticità: autorizzazioni

- **Decreto di compatibilità ambientale: previsto entro settembre**
 - **Istanza generale di decommissioning (APAT e Ministero sviluppo economico)**
 - presentata il 31 dicembre 2001
 - parere APAT e successivo decreto di disattivazione del Ministero sviluppo economico
 - **Autorizzazione modifica impianto (APAT)**
 - concluso l'iter della Commissione tecnica per la ventilazione del contenitore della sezione nucleare
-

Attività di smantellamento

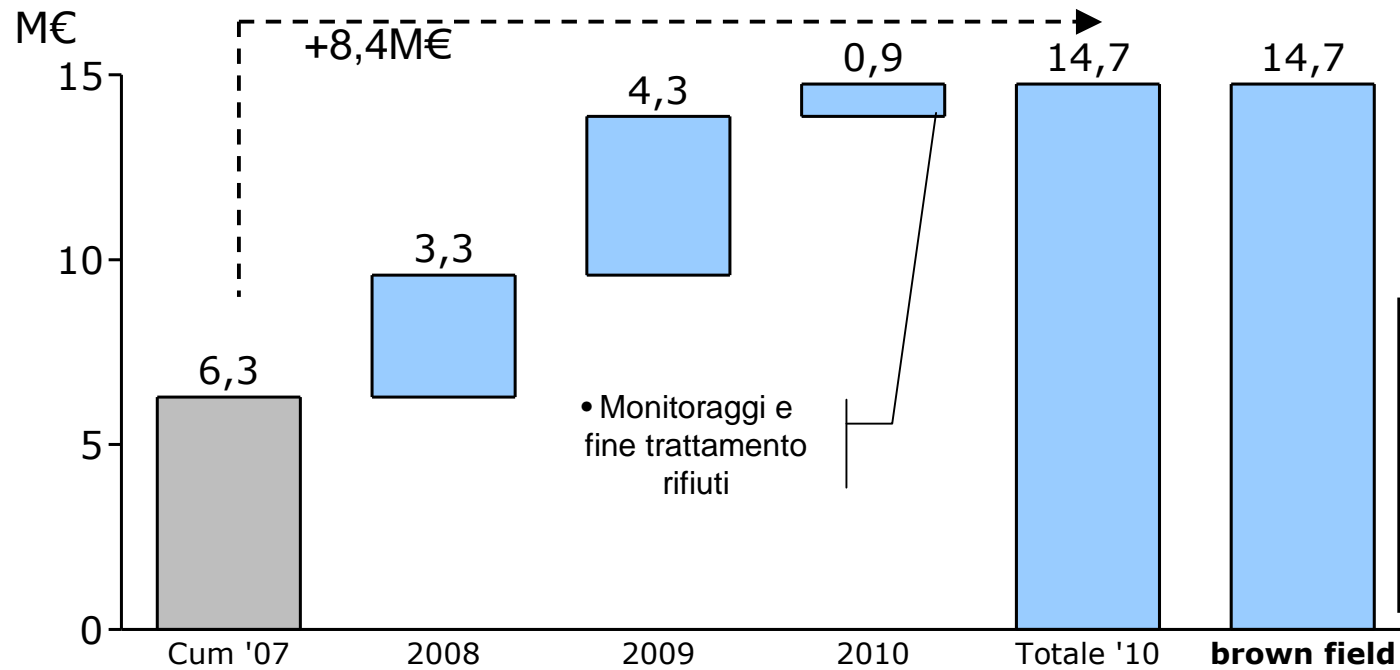

Conclusione smantellamento nel 2009

**Attività concluse nel 1° semestre 2008**

- Gara per lo smantellamento definitivo dell'impianto ✓
- Apertura cantiere il 7 luglio 2008 (opere preparatorie) ✓
- Iter di qualifica del sistema di decontaminazione meccanica ✓

Obiettivi 2008

- Avvio smantellamento e decontaminazione della parte nucleare

Criticità

- Approvazione APAT apparecchiatura di decontaminazione e licenza di esercizio ministero sviluppo economico
- Decreto di disattivazione ministero sviluppo economico

Decreto di disattivazione previsto entro Agosto



TAVOLO DELLA TRASPARENZA

Regione PIEMONTE

Torino, 17 luglio 2008
